



MINISTRE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES MINES

REPUBLIQUE DU BENIN



DIRECTION GENERALE DE L'EAU

REVUE SECTORIELLE EAU & ASSAINISSEMENT — GESTION 2025

BILAN D'EXÉCUTION DU PTA DU PROGRAMME « EAU »

GESTION 2025

Kolawolé Saïd HOUNKPONOU

Directeur Général de l'Eau
Responsable du Programme « Eau »

Cotonou, le 03 septembre 2026

Plan de la présentation



1 Introduction

2 I. Brève présentation du programme

3 II. Ressources allouées au Programme — gestion 2025

4 III. Niveau d'exécution physique et financière au 31 déc. 2025

1 IV. Principales réalisations

2 V. Réformes entreprises dans le secteur

3 VI. Difficultés et recommandations

4 Conclusion

Eau pour Tous et pour Tout !

Contexte et fondements de la réforme



- Le Bénin s'est engagé activement depuis 2013 dans la réforme des finances publiques, avec en toile de fond la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).
- Le dispositif organisationnel était peu performant dans la mobilisation et la gestion des investissements en infrastructures de captage et de distribution d'eau potable.
- En réponse, plusieurs réformes et projets ont été engagés par le Gouvernement pour l'accès universel à l'eau potable, à un horizon plus proche que celui de l'ODD N°6.

2016

Moins de la moitié de la population béninoise avait accès à l'eau potable.

Conséquence directe : maladies d'origine hydrique et pertes en vies humaines, justifiant l'accélération des réformes du secteur.

Eau pour Tous et pour Tout !





Présentation du programme

Trois structures partenaires, une mission commune au service de l'eau potable.

Un programme, trois structures, une mission commune



PROGRAMME « EAU »

Accès équitable à l'eau potable, à l'assainissement et à la valorisation des ressources en eau

DG-Eau

3 projets

Action : Régulation et GIRE

Promouvoir la gestion rationnelle et durable des ressources en eau.

SONEB

21 projets

Action : AEP en milieu urbain

Accroître l'accès équitable et durable à l'eau potable pour les populations en zones urbaines.

ANAEP-MR

07 projets

Action : AEP en milieu rural

Assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable en milieu rural, à un coût abordable.

Eau pour Tous et pour Tout !


II

Ressources allouées au Programme

Budget 2025 : dotations par structure et par axe stratégique.



Budget 2025 du Programme (en milliers de FCFA)

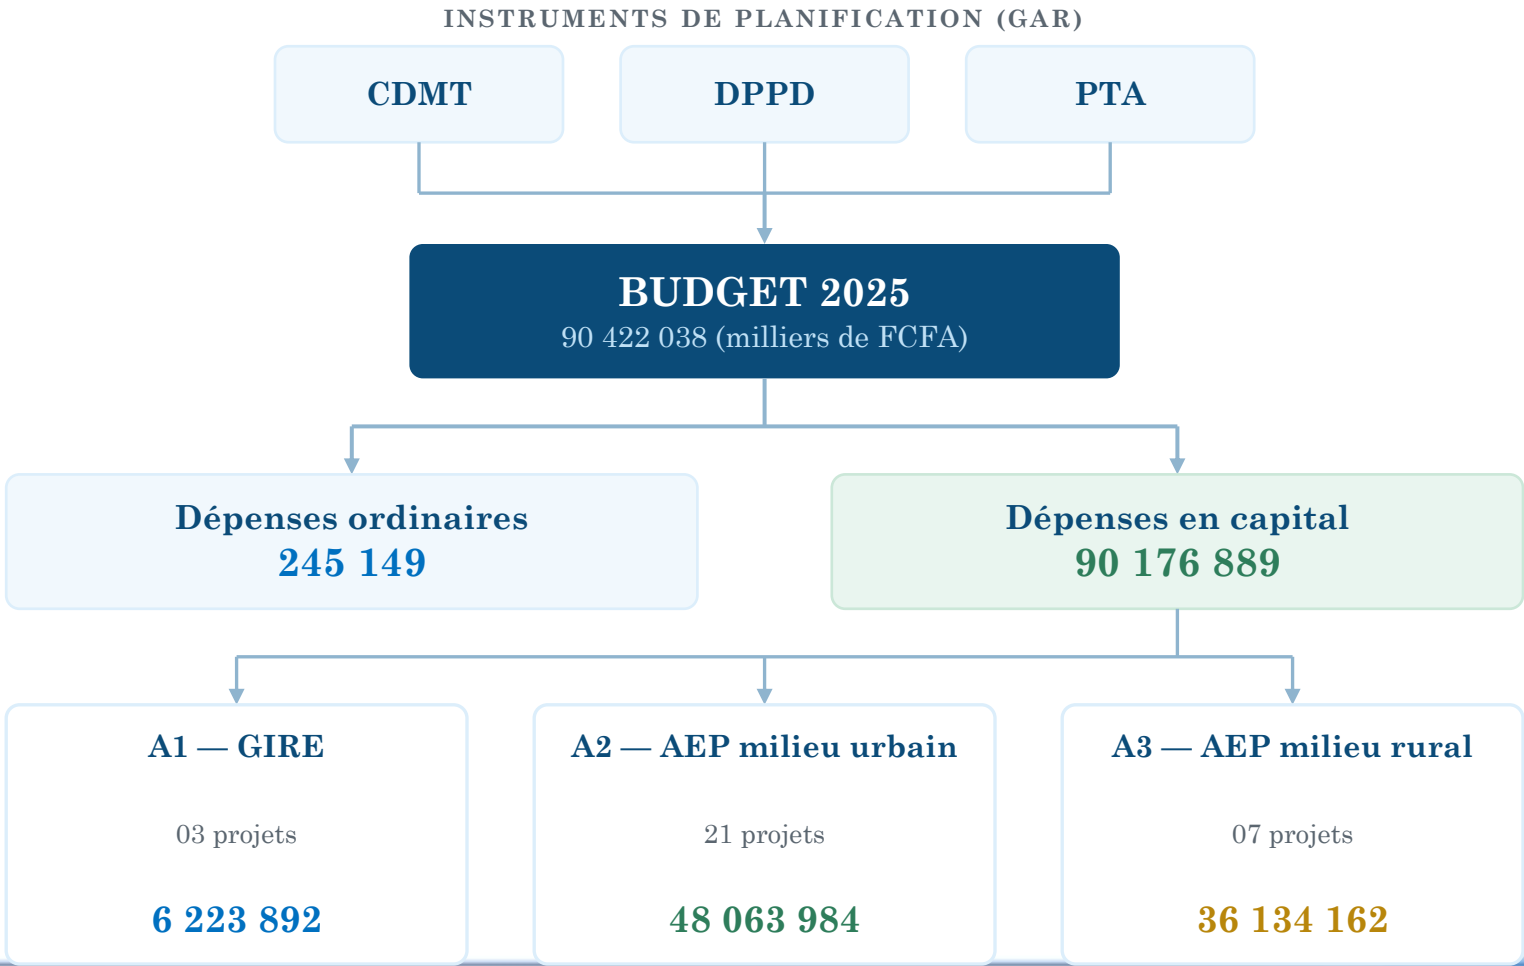

Répartition par structure

Structure	Dotation capital
DG-Eau	5 978 743
SONEB	48 063 984
ANAEP-MR	36 134 162
Total	90 176 889

Le budget d'investissement (dépenses en capital) représente 99,7 % du budget global du Programme Eau, reflétant la priorité donnée aux infrastructures.

Eau pour Tous et pour Tout !



III


Niveau d'exécution physique et financière

Situation au 31 décembre 2025, par structure et par projet.

Vue d'ensemble du Programme Eau



Taux d'exécution physique (TEP)

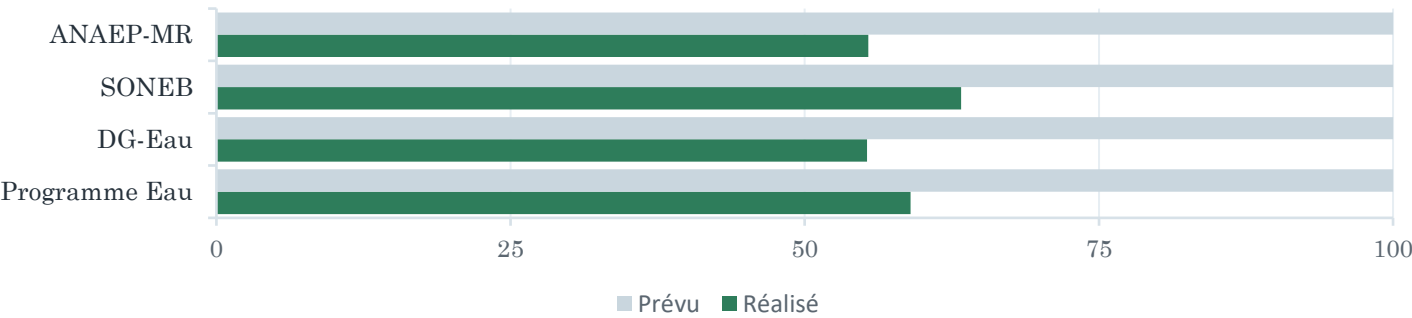

Taux d'ordonnancement (exécution financière)

Structure / Projet	Taux
Programme Eau	93,24 %
DG-Eau	22,04 %
SONEB	60,04 %
ANAEP-MR	170,57 %


Eau pour Tous et pour Tout !





Détail DG-Eau (3 projets)

Taux d'exécution physique (TEP)

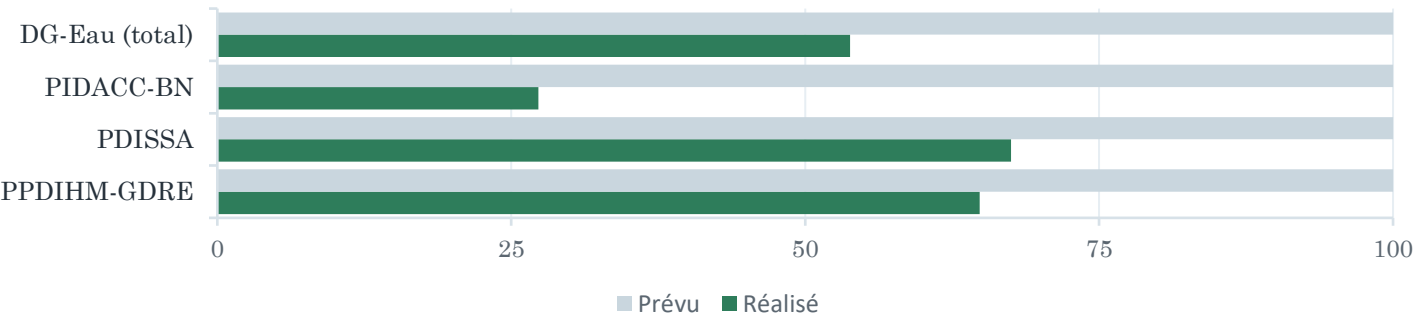

Taux d'ordonnancement
(exécution financière)

Structure / Projet	Taux
PPDIHM-GDRE	63,46 %
PDISSA	7,79 %
PIDACC-BN	6,53 %
DG-Eau (total)	19,55 %


Eau pour Tous et pour Tout !



Détail SONEB — projets (1/2)



Taux d'exécution physique (TEP)

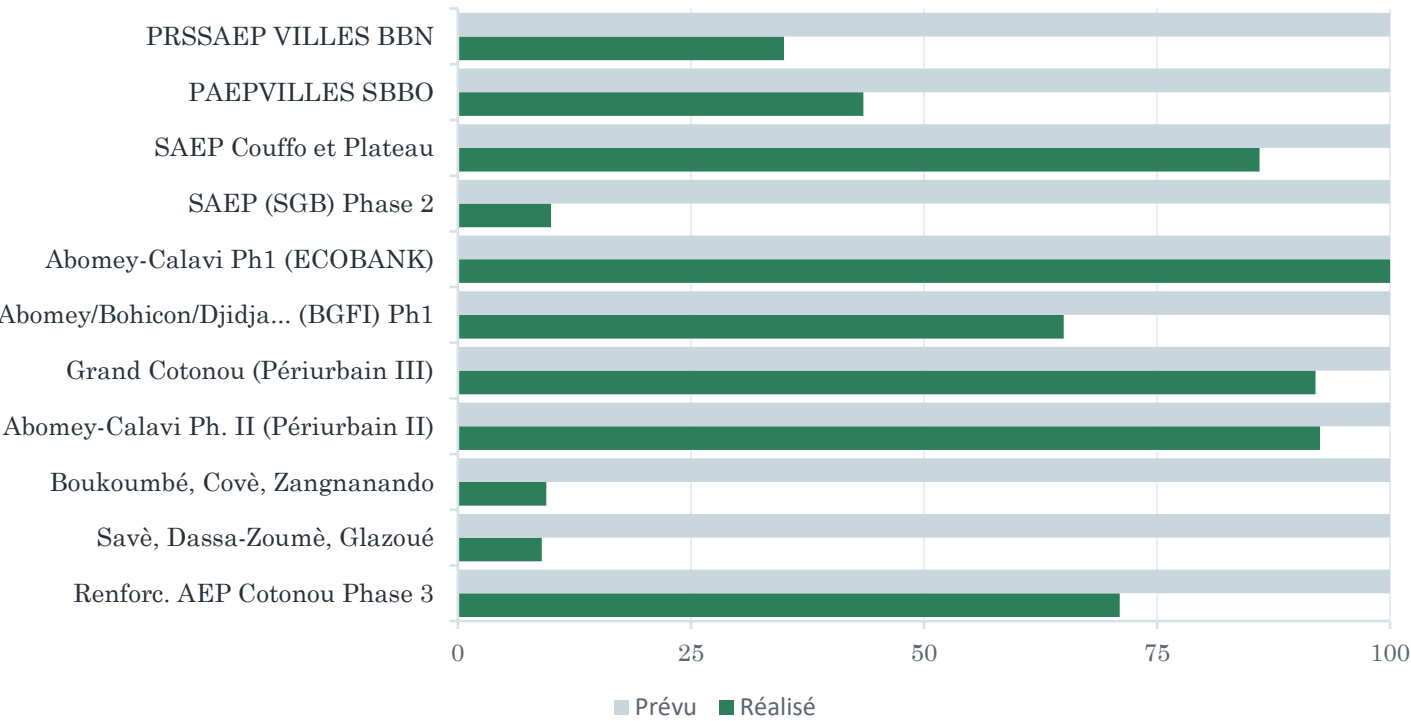

Taux d'ordonnancement (exécution financière)


Structure / Projet	Taux
Renforc. AEP Cotonou Phase 3	0 %
Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué	37,17 %
Boukoubmé, Covè, Zangnanando	0,25 %
Abomey-Calavi Ph. II (Périurbain II)	65,24 %
Grand Cotonou (Périurbain III)	69,39 %
Abomey/Bohicon/Djidja... (BGFI) Ph1	50,77 %
Abomey-Calavi Ph1 (ECOBANK)	63,82 %
SAEP (SGB) Phase 2	46,41 %
SAEP Couffo et Plateau	145,99 %
PAEPVILLES SBBO	50 %
PRSSAEP VILLES BBN	0 %



Détail SONEB — projets (2/2)



Taux d'exécution physique (TEP)

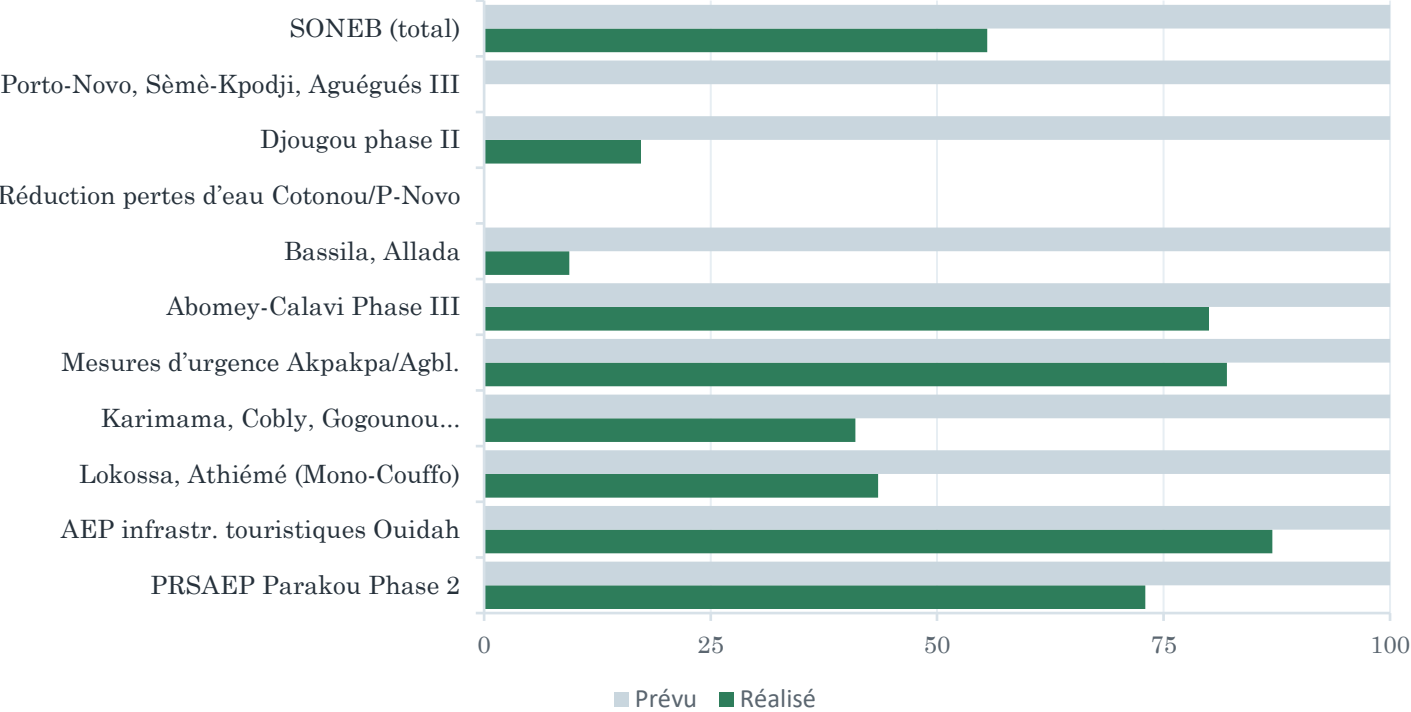

Taux d'ordonnancement (exécution financière)


Structure / Projet	Taux
PRSAEP Parakou Phase 2	75 %
AEP infrastr. touristiques Ouidah	100 %
Lokossa, Athiémé (Mono-Couffo)	75 %
Karimama, Cobly, Gogounou...	0 %
Mesures d'urgence Akpakpa/Agbl.	75 %
Abomey-Calavi Phase III	74,54 %
Bassila, Allada	0 %
Réduction pertes d'eau Cotonou/P-Novo	0 %
Djougou phase II	0 %
Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Aguégoués III	0 %
SONEB (total)	60,04 %



Détail ANAEP-MR (7 projets)



Taux d'exécution physique (TEP)

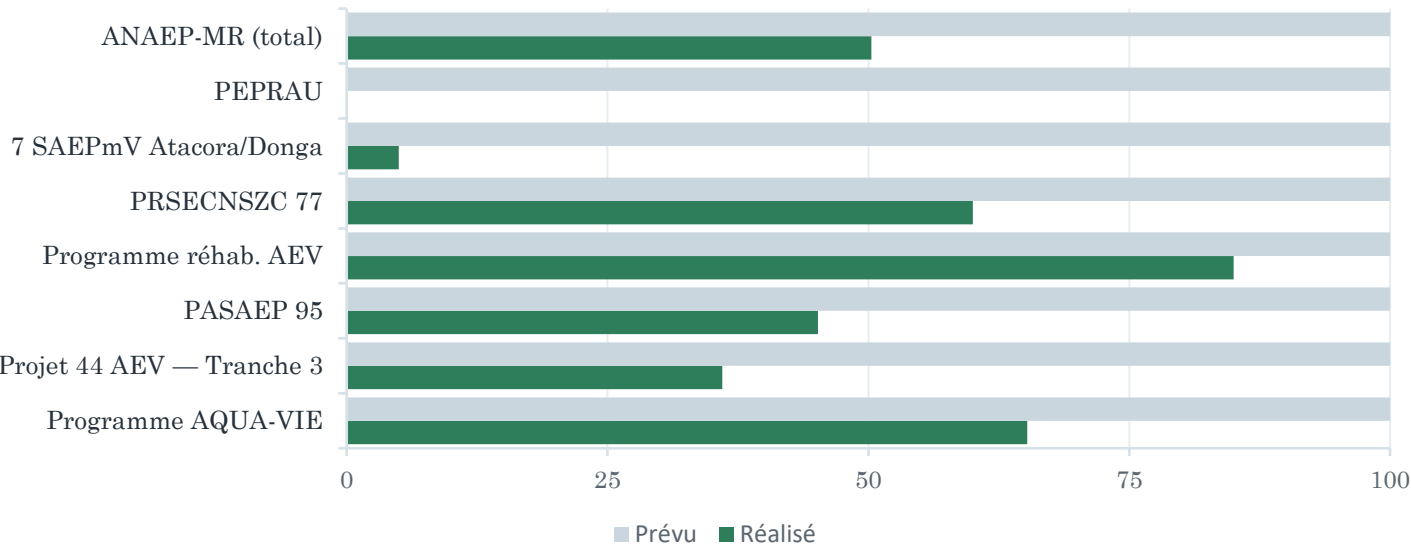

Taux d'ordonnancement
(exécution financière)


Structure / Projet	Taux
Programme AQUA-VIE	727,73 %
Projet 44 AEV — Tranche 3	76,79 %
PASAEP 95	100 %
Programme réhab. AEV	100 %
PRSECNSZC 77	100 %
7 SAEPmV Atacora/Donga	0 %
PEPRAU	0 %
ANAEP-MR (total)	170,57 %






Évolution 2024 → 2025 du Programme Eau

Taux d'exécution physique (TEP)

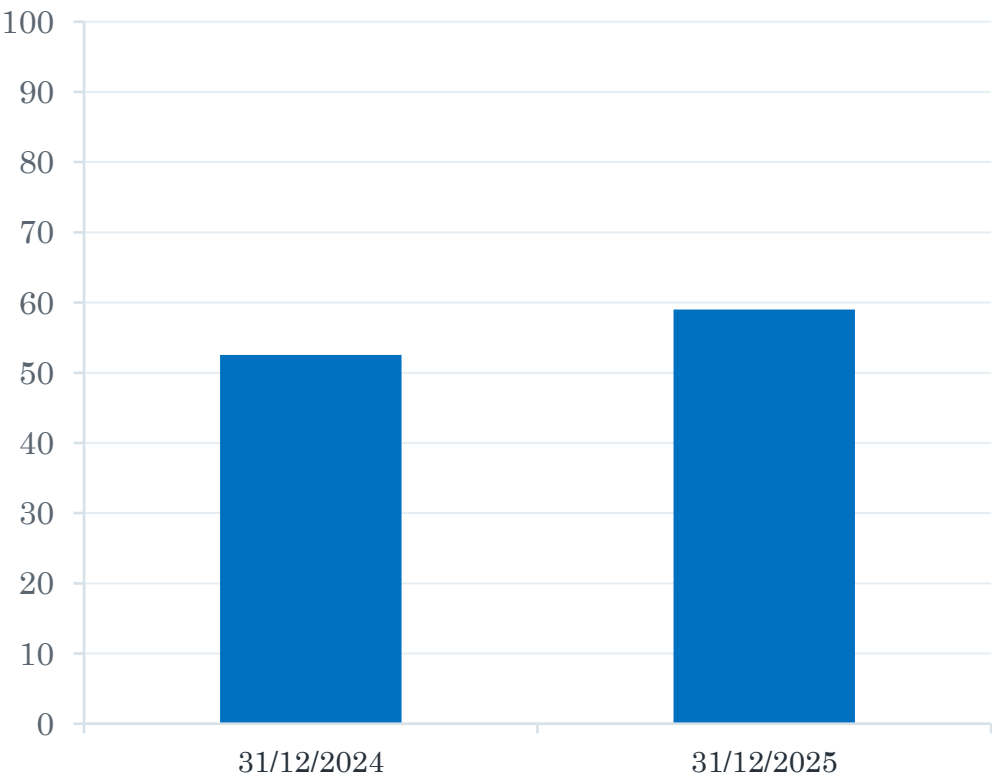

Taux d'exécution financière (TEF)

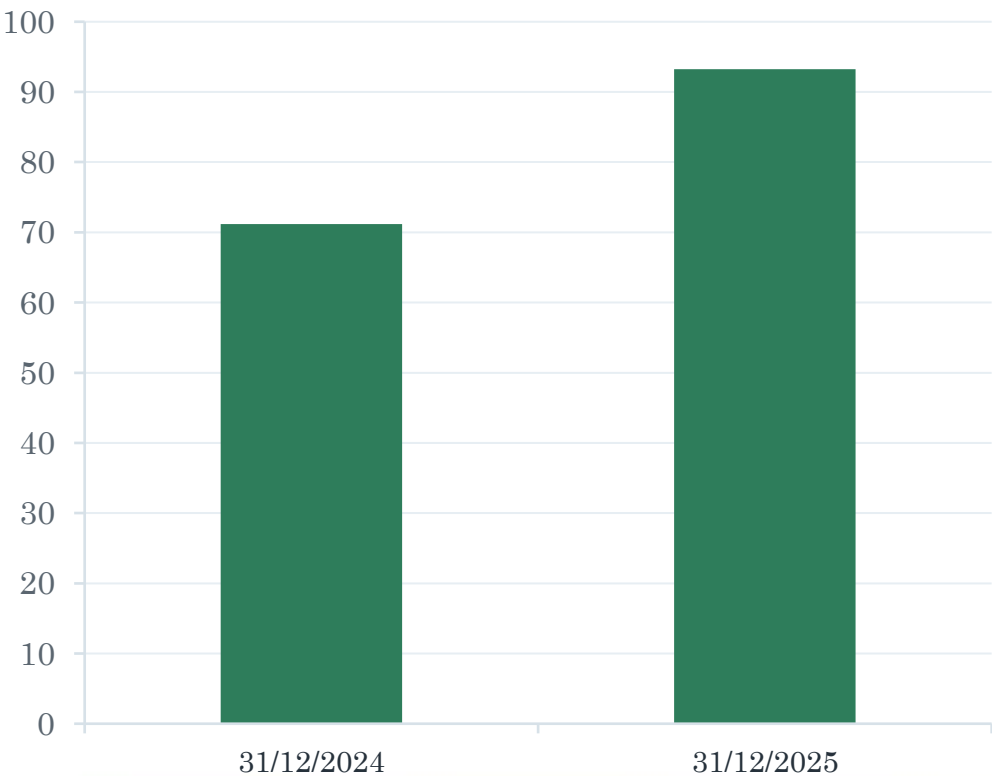

Eau pour Tous et pour Tout !



IV

Principales réalisations

Dix fiches projets, illustrées, présentant les avancées majeures de 2025.

Action Régulation et GIRE

- Transferts des contributions nationales aux Autorités de Bassins et autres organes.
- Aménagement et valorisation des 45 forages artésiens : composante des ouvrages AEP exécutée à 75 % (35 BF sur 45).
- Élaboration du SDAGE Mono-Couffo et actualisation du SDAGE Ouémé : validation du rapport de démarrage ; réception des livrables ; diagnostic et état des lieux en cours.

Projet PDIHM/GDRE

TEP au 31/12/2025

64,85 %

Eau pour Tous et pour Tout !

Illustrations — Projet PDIHM/GDRE



Travaux de construction des étangs piscicoles à Kpota (Lokossa)



Forage artésien à Zoumè (Lokossa)

Eau pour Tous et pour Tout !

Action Régulation et GIRE

- Poursuite, achèvement et réception provisoire des travaux de barrages et d'aménagement de périmètres irrigués sur les 4 sites (Wéna, Séréwondirou, Sinahou et Bassini).
- Mesures environnementales et sociales : emblavure de 114 ha (ATDA 2 et 4, riz et maïs) ; entretien des périmètres reboisés, pare-feux et panneaux de signalisation ; semences maraichères ; aliments et empoissonnement des étangs piscicoles ; formation des maraichers et pisciculteurs.
- Taux global d'exécution des travaux de barrages et d'aménagement = 100 % au 31 décembre 2025.



PDISSA

Eau mobilisée par barrage

Barrage	Volume (m³)
Wéna	2 360 000
Séréwondirou	2 190 000
Bassini	2 006 310
Sinahou	1 810 000

TEP au 31/12/2025
67,50 %



Illustrations — Projet PDISSA



Barrage de Sinahou réceptionné — 1 810 000 m³



Aménagement du périmètre irrigué à Wéna

Eau pour Tous et pour Tout !

Action Régulation et GIRE

- Démarrage de la mission d'élaboration de 13 plans communautaires d'adaptation au changement climatique.
- Réalisation des dispositifs biologiques de défense et de restauration de 1 000 ha de sol à Kalalé, Gogounou, Bembérèkè, Banikoara, Nikki et Kouandé.
- Démarrage de la réhabilitation de deux retenues d'eau pastorales à Liboussou (Ségbana) et à Somi-Kérékou (Banikoara).
- Reboisement de 260 ha dans le cadre des travaux communautaires.

PIDACC

TEP au 31/12/2025

27,31 %

Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu urbain



- Achèvement des travaux de construction d'une station de traitement d'eau de 1 000 m³/h à Sèmè-Kpodji pour la desserte d'Akpakpa, Agblangandan et environs.
- Achèvement des travaux du projet d'AEP des infrastructures touristiques de la ville de Ouidah et Avlékété.
- Achèvement et réception des travaux de renforcement de l'usine d'eau de Ouando à Porto-Novo (équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques ; tours de dégazage ; 56 km de conduites PEHD et PVC).
- Achèvement des travaux d'extension et de densification des réseaux d'eau potable à Parakou (390 km de conduites posées).
- Travaux de pose de la conduite d'adduction d'eau brute PEHD DN 800 mm entre les forages de Kpinsa et l'usine d'eau de Godomey, en cours d'achèvement.
- Travaux d'équipement des forages, construction d'un réservoir au sol de 2 000 m³ et réhabilitation des stations de traitement de Godomey et Védoko.

Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu urbain (suite)

Projet AEP Abomey-Calavi, phase 3



Travaux de soudure de conduites PEHD DN 710 mm
à Zinvié



Nouveau château d'eau de 1 000 m³ construit à
Togba

TEP au 31/12/2025

88 %

*au 30 septembre 2025, contre 100 %
attendu.*

Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu urbain (suite)

Projet AEP Infrastructures touristiques Ouidah – Avlékété



Nouveau site de forage aménagé à Ouidah



Tours de dégazage, château d'eau (1 750 m³) et salle de traitement à Gbènan/Ouidah

TEP au 31/12/2025

95 %

au 31 décembre 2025, contre 100 % attendu.

Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu urbain (suite)

Projet AEP Périurbain 3



Tours de dégazage en PEHD à l'usine de Ouando / Porto-Novo



Vue d'ensemble de l'usine de Ouando / Porto-Novo

TEP au 31/12/2025

95 %

au 31 décembre 2025, contre 100 % attendu.


Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu urbain (suite et fin)

Projet AEP Mesures d'urgence Akpakpa



Château d'eau et tour de
dégazage de la station de Sèmè-
Kpodji

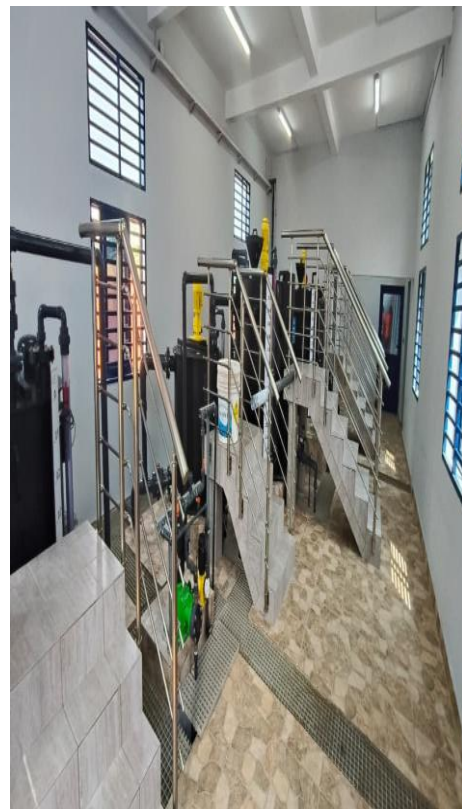

Équipements de la nouvelle
station de Sèmè-Kpodji



Salle des vannes et de la
robinetterie de la station

TEP au 31/12/2025

98 %

au 31 décembre 2025, contre 100 % attendu.

Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu rural



- Réceptions provisoires de 20 SAEPmV sur les 95 SAEPmV conjointement financés par le budget national et la Banque mondiale.
- Poursuite des travaux des lots 1, 2, 3, 4 (77 %) et des SAEPmV de Tohouè, Tangbo-Djèvié et Akpassi 1 (52 %) — Programme AQUA-VIE.
- Constat d'achèvement du Laboratoire National de Référence pour le Contrôle de la Qualité de l'Eau et des Produits de Santé : levée des réserves en cours.
- Poursuite des travaux de six (06) nouveaux SAEPmV par l'entreprise ASI BF — Projet de construction de 44 AEV, tranche 3 du PDAEP-MR.
- Sur le PRSECNSZC 77 : contractualisation d'une 3^e entreprise pour les forages à gros débit ; réalisation de 57/160 forages (débit cumulé de 3 183 m³/heure) ; contractualisation des entreprises pour études, surveillance et contrôle de 80 SAEPmV.



Eau pour Tous et pour Tout !

Action AEP en milieu rural



- Réhabilitation des AEV existantes : travaux de remise en état de fonctionnement et de mise en conformité des 191 AEV du périmètre d'affermage en cours (63 %).
- Achèvement des études diagnostiques en vue des travaux de remise en état et de mise en conformité de 133 AEV en panne.
- Réception provisoire des trois AEV de Banikoara (Atabènou, Kokey et Soroko).

Eau pour Tous et pour Tout !





Réformes entreprises dans le secteur

Huit chantiers de modernisation engagés en 2025.

Huit réformes structurantes en 2025



1

Finalisation du cadre réglementaire de la GIRE : prise des arrêtés d'application des décrets adoptés en Conseil des Ministres le 11 décembre 2024.

2

Dématérialisation de la procédure d'autorisation / déclaration des IOTA.

3

Dématérialisation du paiement des redevances d'exploitation des ressources en eau.

4

Mise en œuvre du principe préleveur-payeur : plus de 220 millions de FCFA collectés.

5

Cadrage du processus de réalisation de forage et dématérialisation de la procédure d'agrément des foreurs.

6

Modernisation de la Base de Données Intégrée (BDI) et du Système d'Alerte précoce ; sécurisation des données au Data Center.

7

Création de la Société Béninoise des Infrastructures de l'Eau et nomination des membres de son Conseil d'Administration.

8

Intégration du secteur Eau dans la Police Environnementale, en cours de création.

Eau pour Tous et pour Tout !



VI

Difficultés et recommandations

Contraintes rencontrées en 2025 et solutions proposées pour 2026.

Principales difficultés rencontrées et solutions proposées



Difficultés	Approches de solution
Retard dans la passation des marchés des projets PDHIM, PIDACC et PDISSA : contrats en signature, dossiers ouverts mais non analysés, dossiers non lancés.	Rattrapage des marchés critiques pour 2026.
Défaut de télétransmission des stations hydrométriques et piézométriques, faute d'entretien (défaut de recrutement du prestataire depuis 2 ans).	Signature d'un accord-cadre à bon de commande pour l'entretien des stations en 2026.
Défaut de passation des marchés de fonctionnement (entretien des locaux, gardiennage, entretien des climatiseurs, etc.).	Analyser la procédure pour payer les prestataires pour services faits ; signature d'un accord-cadre à bon de commande pour 2026.
Inondation des périmètres irrigués de Sinahou, Séréwondirou et Wéna suite aux pluies diluviennes d'août 2025.	Fiche technique pour travaux complémentaires élaborée par le bureau de contrôle ; corrections par l'entreprise durant la saison sèche.

Principales difficultés rencontrées et solutions proposées



Difficultés	Approches de solution
Non-mise à disposition de l'intégralité des ressources financières 2025 pour l'exécution de tous les projets bénéficiant de transferts en capital.	Réaménager le budget 2026 dès son lancement pour réintégrer les projets concernés (Parakou, Akpakpa) et régler les dettes 2025 ; tenir en urgence un dialogue de gestion pour faciliter le paiement des décomptes en instance (Ouidah, Avlékété).
Difficulté de mobilisation de la ressource en eau souterraine dans la zone de socle à Banikoara.	Réexaminer la question de mobilisation de la ressource en eau souterraine à Banikoara.
Situation d'insécurité dans le Nord retardant l'exécution des forages à Banikoara.	Échanges en cours au niveau de l'Agence ; possibilité de retirer le marché du site Ounet 2 à l'entreprise pour le confier à une autre entreprise en vue de son achèvement.



Une exécution financière solide, une accélération à poursuivre

90,42 Mrd

FCFA

Budget CDMT 2025

85,56 Mrd

FCFA

Engagé (94,62 %)

84,31 Mrd

FCFA

Ordonnancé (93,24 %)

59 %

TEP global

Exécution physique

- Selon le CDMT gestion 2025, le Programme Eau a bénéficié d'un montant de 90 422 038 008 FCFA.
- Les montants engagés et ordonnancés s'élèvent respectivement à 85 560 654 425 FCFA et 84 307 520 248 FCFA, soit des taux d'exécution financière de 94,62 % (engagement) et 93,24 % (ordonnancement).

« L'Eau pour Tous, pour Tout et à Coût abordable » — une poursuite des chantiers ouverts en 2025 et une accélération de l'exécution du PTA 2026 s'imposent pour atteindre cet objectif.

Eau pour Tous et pour Tout !





MERCI DE VOTRE ATTENTION

Direction Générale de l'Eau — République du Bénin
